

DETALHAMENTO 04: PERGOLADO DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COBERTO

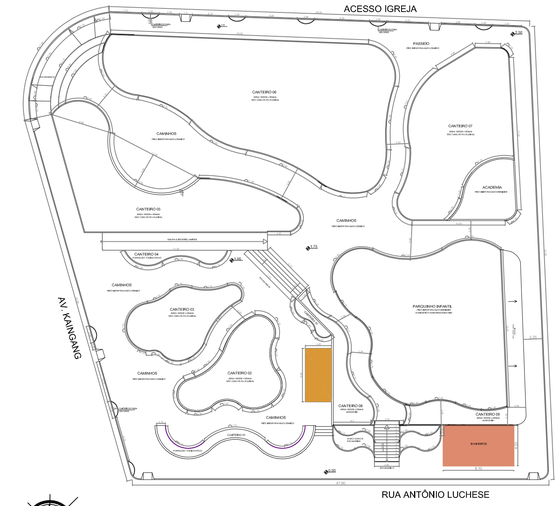


IMPLANTAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DE CANTEIRO
ESC: 1/350


ÁREAS DETALHADAS NESSA PRANCHA

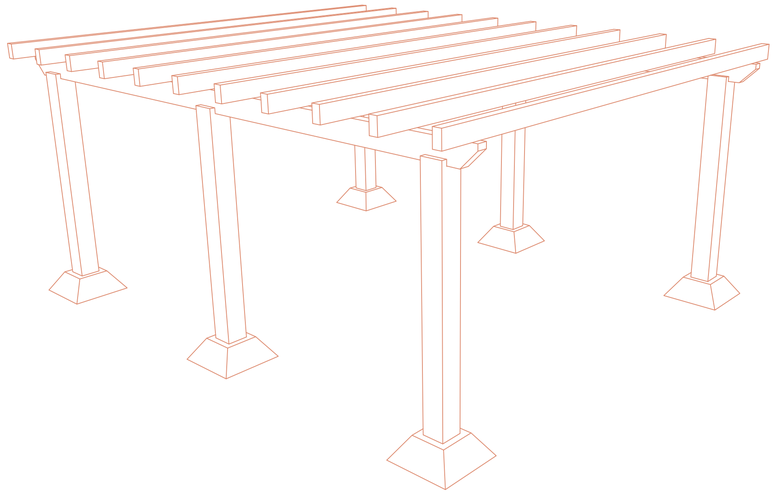


PERGOLADO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
ESC: 1/50

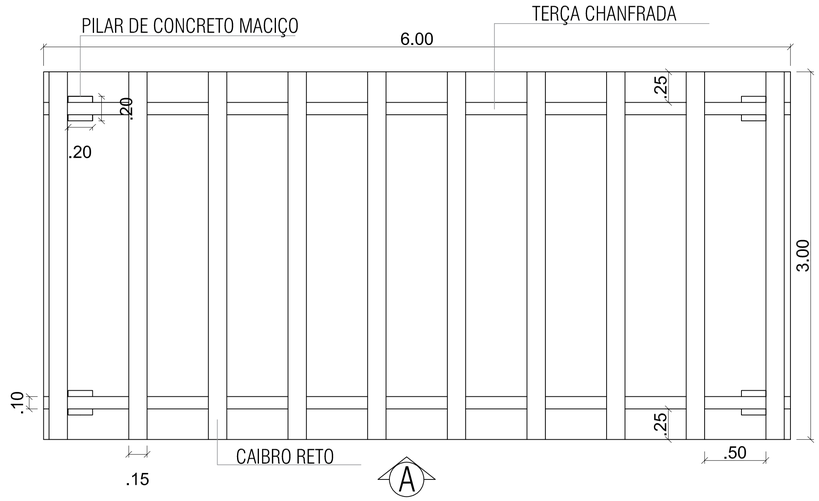


DETALHAMENTO, PERGOLADO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COBERTO
ESC: 1/25

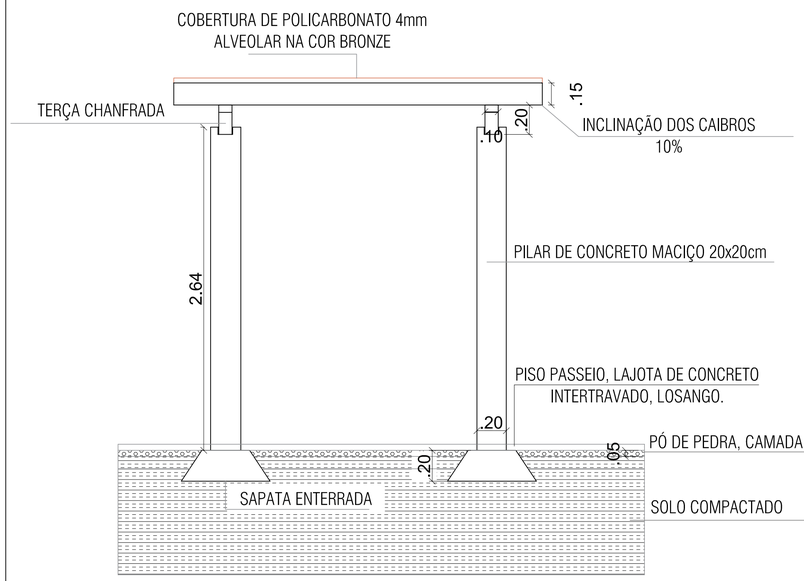


PERGOLADO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COBERTO
VISTA LATERAL "B" ESC: 1/25

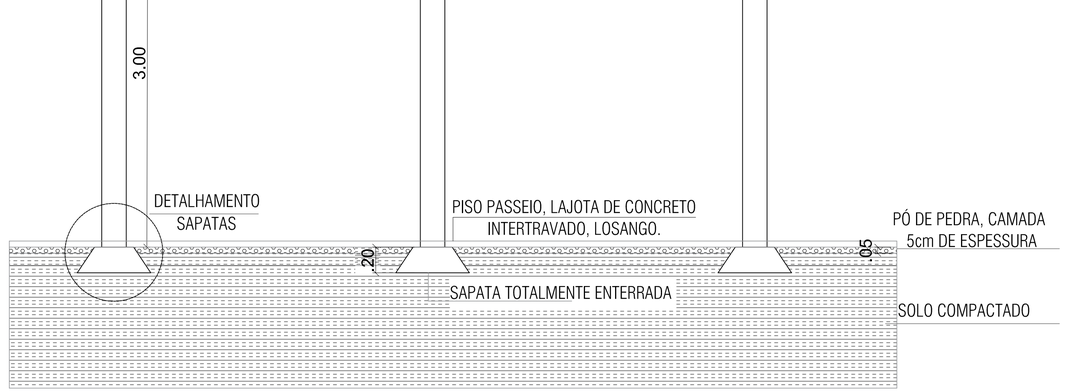

PERGOLADO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COBERTO
VISTA LATERAL "A" ESC: 1/25

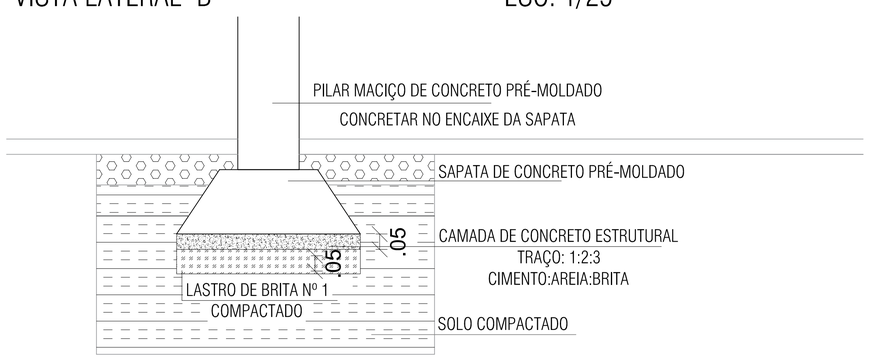

DETALHAMENTO SAPATA, PRÉ-MOLDADA
ESC: 1/10

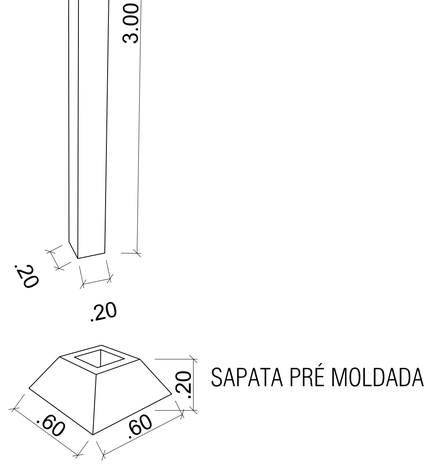

OBSERVAÇÕES:

- AS SAPATAS PRÉ-MOLDADAS DEVEM SER TOTALMENTE APOIADAS E ENTERRADAS NO SOLO, GARANTINDO SUA ESTABILIDADE. SOMENTE APÓS ESSE PROCEDIMENTO DEVERÁ SER REALIZADO O ENCAIXE E A CONCRETAGEM DOS PILARES.
- PARA A CONCRETAGEM DO PILAR MACIÇO NA SAPATA, UTILIZAR CONCRETO TRAÇO 1:2:3, 1 CIMENTO:2 AREIA: 3 BRITA;
- APÓS A FIXAÇÃO DEFINITIVA DOS PILARES, DEVE-SE PROCEDER À INSTALAÇÃO DAS TERÇAS. RECOMENDA-SE QUE ESTA ETAPA SEJA EXECUTADA APENAS DEPOIS DA COMPLETA FIXAÇÃO DOS PILARES, A FIM DE EVITAR DESLOCAMENTOS DAS PEÇAS E REDUZIR RISCOS DE ACIDENTES DURANTE A MONTAGEM.
- AS TERÇAS DEVEM ESTAR INTEGRALMENTE APOIADAS SOBRE OS ENTALHES, POSICIONADAS NO EIXO DOS PILARES, CONFORME ILUSTRADO EM DETALHE CONSTRUTIVO. CONSIDERANDO O PESO PRÓPRIO E A LARGURA DAS PEÇAS, NÃO SE FAZ NECESSÁRIA A FIXAÇÃO MECÂNICA DAS TERÇAS AOS PILARES;
- DE FORMA ANÁLOGA, OS CAIBROS DEVEM SER ASSENTADOS SOBRE AS TERÇAS, GARANTINDO APOIO CONTÍNUO. A FIXAÇÃO DOS CAIBROS DEVERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE ARGAMASSA COLANTE E/OU PARAFUSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO.

gov.br Documento assinado digitalmente
ADRIELI SILVESTRO
Data: 07/08/2026 17:23:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ADRIELI SILVESTRO ARQUITETURA | URBANISMO | INTERIORES

ARQUITETA E URBANISTA: ADRIELI SILVESTRO
CAU RS: A 131293-6

MARCIO CAPRINI:00651208092 Assinado de forma digital por MARCIO CAPRINI:00651208092 Dados: 2026.08.10 08:47:37 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE

CPF/CNPJ: 92.830.777/0001-00	FONE:(54)3552-1266
ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA KAINGANG, CENTRO	DATA: JULHO / 2026
PROJETO URBANO, PRAÇA DA MATRIZ	
CONTEUDO: DETALHAMENTO CONSTRUTIVO	ESCALA: INDICADA / ÁREA: 2.805,10 M²

PRANCHA: 12
